

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORIA ECONOMIA E INGENIERIA
FINANCIERA“

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO

“IMPACTO DEL CREDITO DEL DESARROLLO HUMANO ASOCIATIVO EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE EL PERIODO 2013”

DOCENTE COORDINADOR

Dr. Jaime Fabián Díaz Córdova

DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:

Dr. Jaime Fabián Díaz Córdova

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S)

INSTITUTO NACIONAL ECUTORIANO DE ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA (IEPS)

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Ing. Manuel Chavarrea

Ing. Medardo Olivo

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-IF-E-001-SEP2013-FEB2014”

Ambato, 14 enero de 2014

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA
FACULTAD**

**CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ECONOMÍA E INGENIERIA
FINANCIERA“**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO:

**“IMPACTO DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO ASOCIATIVO EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE EL PERIODO 2013”**

DOCENTE COORDINADOR:

Dr. Jaime Fabián Díaz Córdova

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO:

Dr. Jaime Fabián Díaz Córdova

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

**INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE ECONOMIA POLULAR Y
SOLIDARIA (IEPS)**

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Ing. Manuel Chaverrea

Ing. Medardo Olivo

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD–CA-IF- E–001–SEPT 2013–FEB 2014”

Ambato, 14 de Octubre de 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO

Pág.

Carátula

Índice

1. Datos Generales del Proyecto.	
1.1 Nombre del Proyecto.	3
1.2 Entidad Ejecutora.	3
1.3 Cobertura y Localización.	3
1.4 Monto.	3
1.5 Plazo de Ejecución.	3
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	3
1.7 Número de Docentes Participantes.	3
1.8 Número de Estudiantes Participantes	3
1.9 Entidad Beneficiaria	3
1.10 Número de Beneficiarios	3
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	6
2.3 Línea Base del Proyecto.	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	7
3. Objetivos del Proyecto	8
3.1 Objetivo General	9
3.2 Objetivos Específicos	9
3.3 Matriz de Marco Lógico.	10
4. Estrategia de Ejecución.	12
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	12
5. Presupuesto y Financiamiento.	14
5.1 Presupuesto del Proyecto	
6. Anexos.	15
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	15
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	16

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“IMPACTO DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO ASOCIATIVO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE EL PERIODO 2013”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
Universidad Técnica de Ambato (UTA), Facultad de Contabilidad y Auditoría (FCA).
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
Provincia de Tungurahua
1.4 MONTO:
\$ 958,00 Dólares Americanos
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
3 Meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
SECTOR: Sector Social y Financiero TIPO DE PROYECTO: Estudio e Investigación
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
Uno
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
17 Estudiantes
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
Instituto Nacional Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria (IEPS)
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
1091 personas beneficiarias de los Créditos de Desarrollo Humano

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

El Instituto Nacional Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, y el Programa de Protección Social son entidades adscritas al Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya función es incluir a todas y todos los Ecuatorianos a la participación económica y social. Ésta entidad ha desarrollado el Programa de Créditos de Desarrollo Humano Asociativo, para beneficiarios del bono de Desarrollo Humano con la finalidad de combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida, formando fuentes de empleo, y esencialmente ser un motor de emprendimiento a la productividad de las familias beneficiarias.

Desde el 2012 hasta finales de agosto de 2013 se han entregado 1811 créditos compuestos por 22 proyectos en el 2012 (792 beneficiarios), y 23 proyectos en el 2013 (1019 beneficiarios), siendo efectivamente otorgados 1091 créditos asociativos para el año 2013, destinados a las actividades agrícolas, crianza y comercialización de ganado y aves en toda su diversidad de especies y otros que generan valor agregado. La entrega de los Créditos de Desarrollo Humano tiene como finalidad erradicar la pobreza en las familias vulnerables a través del emprendimiento y generar beneficios económicos sustentables en el tiempo.


Para esto el Instituto Nacional Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria pretende conocer cuáles son los resultados obtenidos a través de estos proyectos socio productivos puesto que no existen datos e información para comprobar los efectos y resultados obtenidos a través del Crédito de Desarrollo Humano.

El Instituto Nacional Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria busca conocer cuáles son los resultados que se están proporcionados a través de los proyectos socio productivo que fueron cofinanciados por el Crédito del Desarrollo Humano, hasta la actualidad no se han realizado investigaciones a los proyectos para conocer el impacto en la economía de las familias beneficiarias de estos créditos.

La estructura institucional, la falta de recursos y personal son unas de las principales causas por la cual no se puede cuantificar resultados por parte de la gestión administrativa.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:

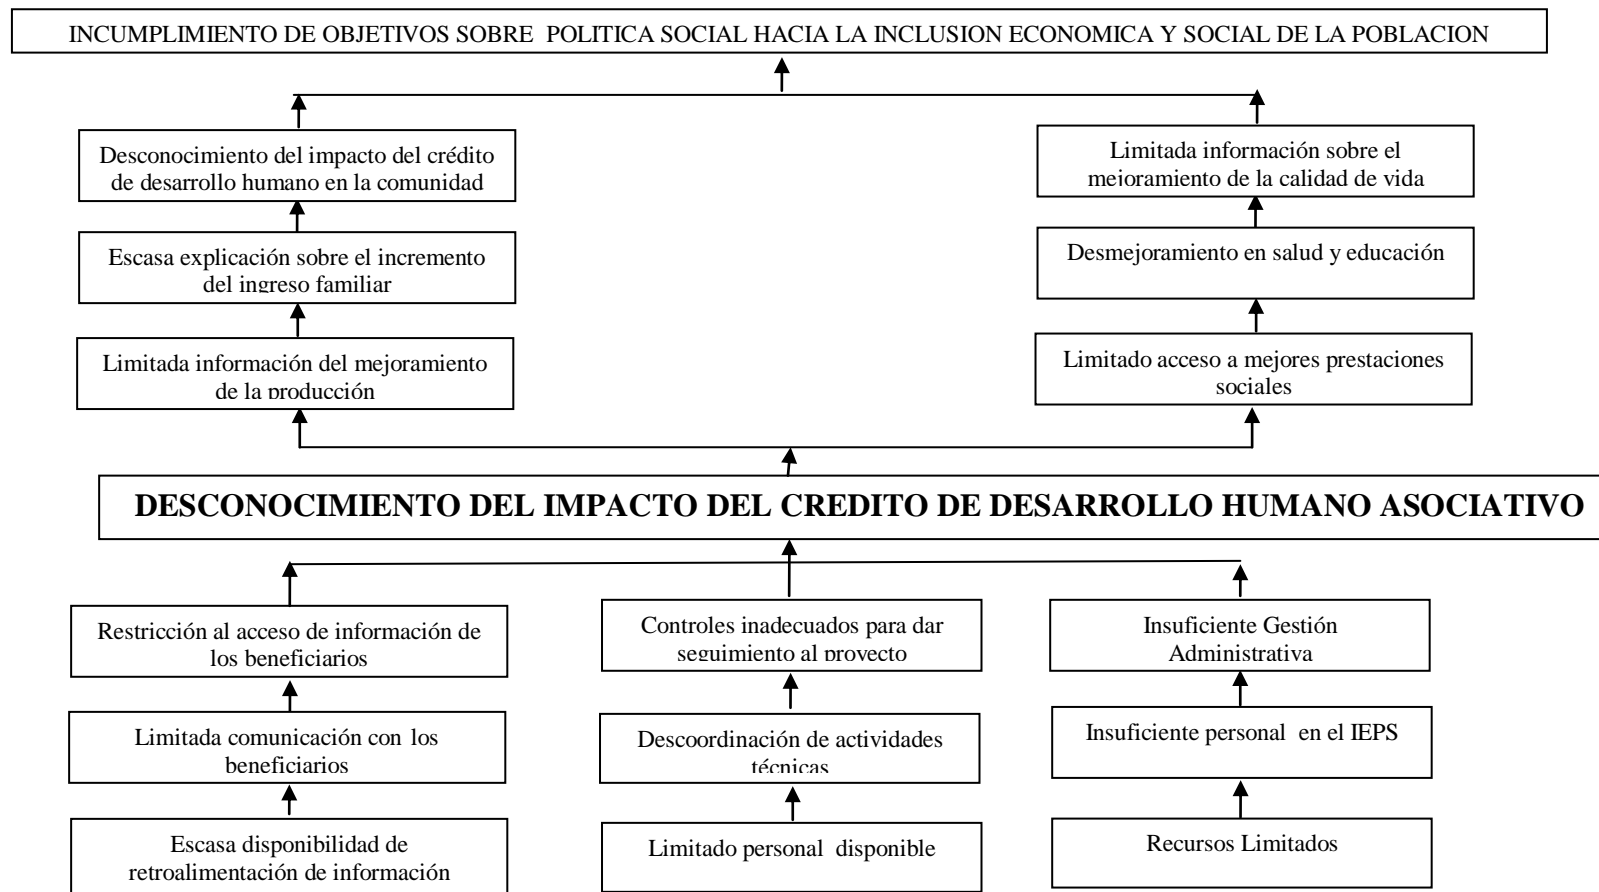

b). Interpretación:

El desconocimiento del destino de los créditos de desarrollo humano se produce por la ausencia de gestión administrativa y seguimiento del programa por parte del IEPS, por la limitada accesibilidad a la información de los beneficiarios, recursos limitados y otros factores externos e internos propios de la administración pública. El desconocimiento sobre los efectos que han tenido los créditos otorgados por el IEPS no permite evaluar ni cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir, y con la función principal del Instituto Nacional Ecuatoriano de economía popular y solidaria que es incluir a toda la población a participar de la economía y desarrollo del país

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Social y Financiero	Proyecto de estudio e investigación	<p>80% destino de los créditos de desarrollo humano</p> <p>75% restricción al acceso de información de los beneficiarios</p> <p>95% controles inadecuados para dar seguimiento al proyecto</p> <p>80% insuficiente gestión administrativa</p>

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):


El número de operaciones del Crédito de Desarrollo Humano (CDH), desde el 2007 al 2012 suma un total de 1'025,348 de colocaciones a nivel nacional, de los cuales 9932 se han entregado a través del CDH Asociativo (desde el 2011 al 2012), bajo esta modalidad solo en el años 2012 se han entregado 9793 créditos asociativos a nivel nacional. Dentro de este periodo (2012 y 2013), en la provincia de Tungurahua se concedió 1811 financiaciones concediendo (22 proyectos en el año 2012, a través de la modalidad asociativa llegando a 792 beneficiarios; y para el año 2013 se calificaron 23 proyectos asociativos llegando a 1019 beneficiarios hasta agosto de este año).

Del total de créditos otorgados se entregaron efectivamente a 1019 beneficiarios hasta agosto de 2013 y 72 créditos otorgados en septiembre del mismo año, logrando un total de 1091 beneficiarios del crédito en Tungurahua, (según datos proporcionada por el IESP de la provincia).

La inversión del gobernó a través de este instituto fue de 12'558,796 millones de dólares de un total de 579'36,7141 millones desde el 2007 hasta el año 2012, de los cuales 7'815,752 pertenecen a créditos asociativos.

La población objeto de estudio (1091 beneficiarios), se concentrará en una muestra de 274 créditos Asociativos otorgados por el IESP en la provincia de Tungurahua durante los periodos económicos 2012 hasta finales de septiembre de 2013

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Estudiar en forma conjunta y participativa el impacto del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo en la Provincia de Tungurahua durante los periodos 2012 hasta agosto de 2013.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Establecer procedimientos que permitan el acceso de información de los beneficiarios
- Describir controles adecuados para realizar el seguimiento a los proyectos otorgados por el IEPS.
- Proponer herramientas informáticas para una correcta Gestión Administrativa de los proyectos o créditos concedidos a través del IEPS.



3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO			
Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
Contribuir al cumplimiento de la política social de apoyo a la inclusión económica y social de la población	Evaluar a diciembre de 2014 el 95% de los proyectos del CDH en la provincia de Tungurahua	Informes de evaluación	Que se mantengan los programas implantados por el gobierno.
PROPÓSITO:	Indicadores del Propósito:	Medios del propósito:	Supuestos del propósito:
Conocimiento del impacto del crédito de desarrollo humano asociativo	Conocer en un 80% el impacto de los proyectos del crédito de desarrollo humano, al finalizar el proyecto	Encuestas e informes de los datos obtenidos	Continuidad con el programa del CDH

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
COMPONENTES 1) Acceso a información de los beneficiarios 2) Controles adecuados para dar seguimiento al proyecto 3) Correcta gestión administrativa	Lograr incrementar en un 70% de información sobre los beneficiarios del crédito asociativo durante el proyecto. Elevar en un 60% la evolución de los proyectos mediante indicadores de gestión (número de seguimientos vs número de colocaciones) durante el proyecto Mejorar en un 40% la gestión administrativa, mediante la medición de los objetivos del IEPS vs. la calidad de vida de la beneficiarios del CDH al finalizar el proyecto	Informes Cuadro de indicadores de seguimiento de proyectos Estudio sobre pobreza, mejoraría y crecimiento de la calidad de vida de la población	Reporte semestral de representantes de Asociaciones Reuniones periódicas para evaluación los proyectos Autoevaluación del IEPS y creación de nuevos servicios


<p>1.1) Creación de un cronograma de actividades</p> <p>1.2) Solicitar documentos que sustenten la información sobre los proyectos que se encuentran ejecutando</p> <p>2.1) Elaborar una base de datos con la información de las asociaciones y los beneficiarios del CDH</p> <p>2.2) Calcular la muestra de estudio y delegar responsables en cada una de las asociaciones para su estudio</p> <p>2.3) Visitar a los beneficiarios del CDH para monitorear el uso del Crédito asociativo</p> <p>3.</p> <p>3.1) Conocer a través de entrevistas y encuestas el uso del CDH y el emprendimiento realizado a través de documentos, fotos u otros medios</p> <p>3.2) Analizar la información obtenida en las visitas a los beneficiarios del créditos mediante cálculos y gráficos</p> <p>3.3) Constatar que los proyectos se hayan cumplidos con los objetivos del IEPS, mediante indicadores.</p>	<p>Cronograma de actividades</p> <p>Validación de documentos y datos de cada uno de los proyectos en el archivo del IEPS</p> <p>Actualización de base de datos para seguimiento de proyectos</p> <p>Monitoreo aleatorio de los créditos otorgados</p> <p>Visita realizadas en periodos de ejecución del proyecto</p> <p>Validar los emprendimientos a través de estudios continuos</p> <p>Informes de análisis realizados</p> <p>Análisis de los proyectos vs objetivos del IEPS</p>	<p>Cronograma de actividades</p> <p>Informes de validación de documentos</p> <p>Archivo de datos en hojas de cálculo actualizado</p> <p>Informes</p> <p>Hoja de ruta de visitas</p> <p>Encuestas</p> <p>Cuadros y gráficos de análisis</p> <p>Nuevos estudios realizados</p>	<p>Realización y ejecución Continua de cronogramas de actividades para evaluación de proyectos con técnicos y gestores comunitarios</p> <p>Registro de trabajo de realizado</p> <p>Hojas de cálculo dinámicas sobre ejecución de trabajo</p> <p>Informes de técnicos y gestores comunitarios.</p> <p>Seguimiento de créditos</p> <p>Verificar de encuestas</p> <p>Comunicación continua de resultados</p> <p>Reuniones de evaluación</p>
--	--	--	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Acceso a información de los beneficiarios					
Actividad 1.1					
Subactividad 1.1.1. Creación de un cronograma de actividades	17 de septiembre	al 30 de septiembre	10 horas	Jaime Díaz	Materiales y Tiempo
Subactividad 1.1.2. Solicitar documentos que sustenten la información sobre los proyectos que se encuentran ejecutando	1 de octubre	al 11 de octubre	20 horas	Alumnos	Tiempo
Subactividad 1.1.3. Elaborar una base de datos con la información de las asociaciones y los beneficiarios del CDH	14 de octubre	al 25 de octubre	30 horas	Alumnos	Hojas electrónicas
Componente 2: Controles adecuados para dar seguimiento al proyecto					
Actividad 2.1					
Subactividad 2.1.1 Calcular la muestra de estudio y delegar responsables en cada una de las asociaciones para su estudio	28 de octubre	31 de octubre	10 horas	Jaime Díaz y Alumnos	Aplicaciones informáticas
Subactividad 2.1.2. Visitar a los beneficiarios del CDH para monitorear el uso del Crédito asociativo	1 de noviembre	30 de noviembre	50 horas	Jaime Díaz y Alumnos	Transporte
Subactividad 2.1.3. Conocer a través de entrevistas y encuestas el uso del CDH y el emprendimiento realizado a través de documentos, fotos u otros medios	1 de noviembre	30 de noviembre	50 horas	Jaime Díaz y Alumnos	Materiales
Componente 3: Correcta gestión administrativa					
Actividad 3.1					
Subactividad 3.2.1 Analizar la información obtenida en las visitas a los beneficiarios del créditos mediante cálculos y gráficos	1 de diciembre	al 12 de diciembre	20 horas	Jaime Díaz y Alumnos	Aplicaciones informáticas
Subactividad 3.2.2 Constar que los proyectos se hayan cumplidos con los objetivos del IEPS, mediante indicadores	14 de diciembre	al 22 de diciembre	20 horas	Jaime Díaz y Alumnos	
TOTAL			210 horas		
	DOCENTES AUTORES			ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
	1. Jaime Díaz			Araujo Villarruel Vanessa Elizabeth	

 (F) (TITULO. NOMBRE.) DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	 (F) (TITULO. NOMBRE) COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		Arcos Solís José Luis
			Chango Delgado Omar Geovany
			Córdova Lazcano Edwin Gustavo
			Freire Fiallos Miguel Ángel
			González Garcés David Israel
			Guevara Perrazo Gabriela Alexandra
			Hidalgo Silva Graciela Maribel
			Jácome Delgado Lino Danilo
			Martínez Robalino Abigail Gabriela
			Morejón Araujo Diego Mauricio
			Paredes Zabala Verónica Soledad
			Pérez Cedeño Linda Nicols
			Quinapanta Cuenca Lidia Abigail
			Ramos Tuapanta Daisy Jaqueline
			Sánchez Núñez Luis Fernando
			Toaza López Pablo Abelardo

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.					
DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Nº DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Jaime Díaz	5	20	100	9.58	958.00
TOTAL DEL PROYECTO (USD)					958.00
					
<p>F. _____</p> <p>Dr. Jaime Díaz Córdova</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>					

A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA, ECONOMIA E INGENIERIA FINANCIERA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: IMPACTO DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO ASOCIATIVO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE EL PERIODO 2013							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
1. INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA		DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: 958.00 USD		
2.							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1811		10 de septiembre de 2013	Al 15 de enero de 2014	210 horas			
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUITIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. Manuel Chavarrea 2. Medardo Olivo	1. Coordinador	Jaime Díaz	5	1. Arcos Solís José Luis	100	1. Araujo Villarruel Vanessa Elizabeth	100
	2. Coordinador seguimiento CDH				2. Chango Delgado Omar Geovany	100	2. Guevara Perrazo Gabriela Alexandra
				3. Córdova Lazcano Edwin Gustavo	100	3. Hidalgo Silva Graciela Maribel	100
				4. Freire Fiallos Miguel Ángel	100	4. Martínez Robalino Abigail Gabriela	100
				5. González Garcés David Israel	100	5. Paredes Zabala Verónica Soledad	100
				6. Jácome Delgado Lino Danilo	100	6. Pérez Cedeño Linda Nicols	100
				7. Morejón Araujo Diego Mauricio	100	7. Quinapanta Cuenca Lidia Abigail	100
				8. Sánchez Núñez Luis Fernando	100	8. Ramos Tuapanta Daisy Jaqueline	100
				9. Toaza López Pablo Abelardo	100		

<p>PRESENTADO POR:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>.....</p> <p><i>Jaime Diaz</i></p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>REVISADO POR:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>.....</p> <p><i>Rosalia Vasquez</i></p> <p>COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD EN LA COLECTIVIDAD</p>	<p>INFORME FAVORABLE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>.....</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - QUILINDESA</p> <p>DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO</p> <p>CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD</p>
--	---	--

Ambato, 12 de Julio del 2013

Señor

Ing. Manuel Chavarrea

COORDINADOR IEPS TUNGURAHUA

Presente

De mi consideración:

*Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de **CONTABILIDAD Y AUDITORIA** Carrera de **CONTABILIDAD Y AUDITORÍA** realicen la **Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad " Proyectos del IEPS Tungurahua financiados a través del crédito CDH"***

*Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.*

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

Dr. Guido Tobar Vasco

**DECANO DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE
SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de Julio del dos mil trece el INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA IEPS representada por el Ing. Manuel Chavarrea en calidad de Coordinador del IEPS Tungurahua y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA representada por el Dr. Guido Tobar Vasco en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA IEPS es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de Financiar la la organización y ejecución de proyectos que presenten las entidades que integran la economía popular y solidaria, promoviendo su desarrollo y solidez productiva y financiera.*
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, Carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.*

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- *Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.*

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- *Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS.*
- *Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.*

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES


3.1 El INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA IEPS se compromete a:

- *Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.*
- *Suscribir a través de su coordinador Ing. Manuel Chavarrea los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.*


3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- **Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el INSITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA IEPS y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.**

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido dela presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 12 días del mes de Julio del 2013

f. 

Dr. Guido Tobar Vasco
DECANO FACULTAD DE
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

f. 

Ing. Manuel Chavarrea
COORDINADOR IEPS TUNGURAHUA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD

CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ECONOMÍA E INGENIERIA FINANCIERA“

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO:

“IMPACTO DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO ASOCIATIVO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE EL PERIODO 2013”

DOCENTE COORDINADOR:

Dr. Jaime Fabián Díaz Córdova

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:

Dr. Jaime Fabián Díaz Córdova

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (IEPS)

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Ing. Manuel Chaverrea

Ing. Medardo Olivo




CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD–CA-IF- E–001–SEPT 2013–FEB 2014”

Ambato, 15 de enero de 2014




















ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Estrategias de Monitoreo.	3
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	4
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	5









1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: Acceso a información de los beneficiarios								
Actividad 1.1								
Subactividad 1.1.1. Creación de un cronograma de actividades	17 de septiembre	al 30 de septiembre	10 horas		17 de septiembre	al 30 de septiembre	10 horas	
Subactividad 1.1.2. Solicitar documentos que sustenten la información sobre los proyectos que se encuentran ejecutando	1 de octubre	al 11 de octubre	20 horas		1 de octubre	al 11 de octubre	20 horas	
Subactividad 1.1.3. Elaborar una base de datos con la información de las asociaciones y los beneficiarios del CDH	14 de octubre	al 25 de octubre	30 horas		14 de octubre	al 25 de octubre	20 horas	
Componente 2: Controles adecuados para dar seguimiento al proyecto								
Actividad 2.1								
Subactividad 2.1.1 Calcular la muestra de estudio y delegar responsables en cada una de las asociaciones para su estudio	28 de octubre	31 de octubre	10 horas		28 de octubre	31 de octubre	10 horas	
Subactividad 2.1.2. Visitar a los beneficiarios del CDH para monitorear el uso del Crédito asociativo	1 de noviembre	30 de noviembre	50 horas		1 de noviembre	30 de noviembre	30 horas	
Subactividad 2.1.3. Conocer a través de entrevistas y encuestas el uso del CDH y el emprendimiento realizado a través de documentos, fotos u otros medios	1 de noviembre	30 de noviembre	50 horas		1 de noviembre	30 de noviembre	20 horas	
Componente 3: Correcta gestión administrativa								
Actividad 3.1								
Subactividad 3.2.1 Analizar la información obtenida en las visitas a los beneficiarios del créditos mediante cálculos y gráficos	1 de diciembre	al 12 de diciembre	20 horas		1 de diciembre	al 12 de diciembre	10 horas	
Subactividad 3.2.2 Constatar que los proyectos se hayan cumplidos con los objetivos del IEPS, mediante indicadores	14 de diciembre	al 22 de diciembre	20 horas		14 de diciembre	al 15 de enero 2014	10 horas	
TOTAL			210 horas	958.00			130 horas	958.00
 F: _____ Dr. Jaime Díaz Córdova DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			 F: _____ Ing. Medardo Olivo COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			 F: _____ Eco. Rosario Vascones G. COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		

1. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA							TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	17 al 30 sep.	01 al 11 oct.	14 al 25 oct.	28 al 31 oct.	1 al 30 nov.	1 al 12 dic.	14 al 22 dic.		
1	Araujo Villarruel Vanessa Elizabeth	1600596025	10	20	20	10	50	10	10	130	
2	Arcos Solís José Luis	1804305801	10	20	20	10	50	10	10	130	
3	Chango Delgado Omar Geovany	1804187795	10	20	20	10	50	10	10	130	
4	Córdova Lazcano Edwin Gustavo	1804800983	10	20	20	10	50	10	10	130	
5	Freire Fiallos Miguel Ángel	1804572046	10	20	20	10	50	10	10	130	
6	González Garcés David Israel	1804191763	10	20	20	10	50	10	10	130	
7	Guevara Perrazo Gabriela Alexandra	1804408043	10	20	20	10	50	10	10	130	
8	Hidalgo Silva Graciela Maribel	1804787131	10	20	20	10	50	10	10	130	
9	Jácome Delgado Lino Danilo	1804272985	10	20	20	10	50	10	10	130	
10	Martínez Robalino Abigail Gabriela	1804356895	10	20	20	10	50	10	10	130	
11	Morejón Araujo Diego Mauricio	1804373197	10	20	20	10	50	10	10	130	
12	Paredes Zabala Verónica Soledad	1803290376	10	20	20	10	50	10	10	130	
13	Pérez Cedeño Linda Nicols	0503628372	10	20	20	10	50	10	10	130	
14	Quinapanta Cuenca Lidia Abigail	1804465134	10	20	20	10	50	10	10	130	
15	Ramos Tuapanta Daisy Jaqueline	0201987567	10	20	20	10	50	10	10	130	
16	Sánchez Núñez Luis Fernando	1804455820	10	20	20	10	50	10	10	130	
17	Toaza López Pablo Abelardo	1804076477	10	20	20	10	50	10	10	130	
 F. _____ Dr. Jaime Díaz Córdova DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			 F. _____ Ing. Medardo Olivo COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA								
1. . REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO											

**COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Dr. Jaime Díaz Córdova**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
17/09/2013 al 30/09/2013	12h00 12h00	13h00 14h00	10	Creación de un cronograma de actividades y organización de grupos de trabajo	
01/10/2013 al 11/10/2013	12h00 12h00	13h00 14h00	5 15	Solicitar documentos que sustenten la información sobre los proyectos que se encuentran ejecutando y validación de datos (carpetas de beneficiarios del CDH)	
14/10/2013 al 25/10/2013	12h00 12h00	13h00 14h00	10 20	Elaborar una plantilla en Excel y alimentación de datos de los beneficiarios del CDH y creación de la base de datos de los créditos asociaciones (cronograma de alimento de información por grupos de alumnos participantes)	
28/10/2013 al 31/10/2013	12h00 12h00	13h00 14h00	4 6	Revisión de datos procesados para calcular la muestra de estudio y delegar responsables en cada una de las asociaciones para su estudio con los gestores	
01/11/2013 al 15/11/2013	12h00 12h00	13h00 14h00	10 15	Visitar a los beneficiarios del CDH para monitorear el uso del Crédito asociativo mediante planificación con visita de gestores	
18/11/2013 al 29/11/2013	12h00 12h00	13h00 14h00	10 15	Conocer a través de entrevistas y encuestas el uso del CDH y el emprendimiento realizado a través de documentos, fotos u otros medios	
01/12/2013 al 13/12/2013	12h00 12h00	13h00 14h00	5 5	Analizar la información obtenida en las visitas a los beneficiarios del créditos mediante cálculos y gráficos	
16/12/2013 al 15/01/2014	12h00 12h00	13h00 14h00	5 5	Constatar que los proyectos se hayan cumplidos con los objetivos del IEPS, mediante indicadores	
TOTAL			130		



F: _____

**Dr. Jaime Díaz Córdova
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**



F: _____

**In. Medardo Olivo
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA
FACULTAD**

**CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ECONOMÍA E INGENIERIA
FINANCIERA“**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO:

**“IMPACTO DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO ASOCIATIVO EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE EL PERIODO 2013”**

DOCENTE COORDINADOR:

Dr. Jaime Fabián Díaz Córdova

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:

Dr. Jaime Fabián Díaz Córdova

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

**INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE ECONOMIA POLULAR Y
SOLIDARIA (IEPS)**

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Ing. Manuel Chaverrea

Ing. Medardo Olivo

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD–CA-IF- E–001–SEPT 2013–FEB 2014”

Ambato, 15 de enero de 2014

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Informe Final	3
2. Evaluación de Resultados.	9
3. Fichas de Evaluación.	11
4. Resumen de Beneficiarios	12
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	12
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	13
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	14
6. Producto (s) del Proyecto	15
7. Anexos	25

1. INFORME FINAL

El desarrollo y crecimiento tanto profesional como institucional requiera la participación de diferentes actores tanto públicos como privados, la vinculación con la colectividad realizada en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) Zona 3, no ha permitido crecer e involucrarnos con los actores económicos del país a través del proyecto “IMPACTO DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO ASOCIATIVO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DURANTE EL PERIODO 2013”, con código “FCAUD-CA-IF- E-001-SEPT 2013-FEB 2014”.

Hemos tenido la participación de 17 estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de las diferentes carreras, durante la ejecución del proyecto se realizó una planificación y coordinación con el IEPS, logrando levantar la base de datos de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo otorgados en el periodo 2013, luego de eso se procedió a obtener una muestra representativa otorgada por la Entidad Beneficiaria (IEPS), para luego mediante una cronograma, planificar el levantamiento de campo sobre el impacto del Crédito en la Provincia de Tungurahua y sus Cantones.

Levantada la información y en coordinación con el IEPS se procedió a procesar los datos para realizar el informe del impacto del Crédito y los objetivos logrados a través de este tipo de iniciativas, para en el futuro proponer mejorar y así lograr los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

Procesado los datos se observa que los Créditos Asociativos del CDH logran un promedio de ingresos mensuales de entre USD 105.73 y USD 180.89 siendo calificado como Excelente y Bueno, el impacto de estos rangos representan el 60% cumpliendo así el fin de este crédito y apenas el 23% del total evaluado no ha logrado mejorar porque el promedio de sus ingresos están en 14.68 USD.

Los participantes en vinculación en este caso los alumnos de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, han participado con entusiasmo y actitud positiva para ayudar con este estudio, para quienes hemos participado en este proyecto queremos continuar realizando este tipo de estudios porque aún existe mucho que analizar y ayudar hacia las instituciones y personas actores de la economía del país y la zona.

Queremos extender un Agradecimiento a la Facultad de Contabilidad y Auditoría, a la Universidad Técnica de Ambato y al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS por el apoyo para lograr terminar este proyecto

El 7 de mayo de 2007 mediante decreto ejecutivo se crea el Crédito de desarrollo Humano (CDH) con la finalidad de potenciar las Habilidades y destrezas productivas de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) con la finalidad de generar emprendimiento unipersonales o familiares de autogeneración cumpliendo así con el buen vivir.

El crédito de Desarrollo Humano posee cuatro modalidades: a) Asociativo. Patrocinado por una organización productiva b) Articulado. Usuario incorporado a un proyecto nuevo sin necesidad de pertenecer a una organización c) Microcrédito Empresarial. Para financiar autoempleo o empresas de subsistencia con un monto máximo de 840 USD hasta 12 meses y con una tasa de interés del 15% d) Individual. Concedido para beneficiarios con la finalidad de financiar emprendimiento de producción, comercio o servicios con un monto máximo de 600 USD a 12 meses y con una tasa de interés del 5%.

Desde del 2007 hasta el 12 se han entregado el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria ha entregado 1025348 créditos en todo el territorio ecuatoriano que trasladado en dólares suma un monto total de 579.367.141 USD, es por esta circunstancia que esta investigación busca analizar el impacto de los crédito del CDH Asociativo durante el periodo 2013, dato que se necesitan ser monitoreados continuamente.

Para realizar el estudio e investigación se procedió inicialmente a realizar contacto con el IEPS y observas las necesidades de investigación que este organismo, luego de este primer acercamiento se procedió a firmar un convenio y acta de compromiso que nos permita transferir conocimiento y ayuda mutua para cumplir con el propósito de esta vinculación con la colectividad y entre la Universidad Técnica de Ambato y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS).

Luego realizar el convenio se procedió a realizar una planificación para levantamiento de documentación y organización de una base de datos de los

beneficiarios del CDH, este trabajo se realizó con la cooperación de los alumnos de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de las diferentes carreras, los formatos y procesos fueron diseñados por el profesor coordinador del proyecto y los coordinadores del IEPS.

Una vez levantada la información de los beneficiarios del crédito, se procedió a realizar la selección de la muestra a cargo de los funcionarios del IEPS y se realizó un plan de trabajo para el levantamiento de la información de campo a los beneficiarios según el tamaño de la muestra en los diferentes cantones de la provincia de Tungurahua. Los estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría fueron los encargados de levantar la información mediante el instrumento que el IEPS entregó al Docente coordinador, las visitas a los beneficiarios se coordinó con los gestores que trabajaban en el IEPS.

Finalizada el levantamiento de información el IESPS procesó la información levantada para finalmente obtener los resultados de impacto de CDH.

Avanzando en el análisis de información se procedió a unificar los datos del impacto del CDH con los datos levantados inicialmente y así se obtuvo mayor información como rentabilidad del crédito versus valor del crédito, lugares y sectores con mayor rentabilidad del proyecto, asociación con mejores resultados.

Finalmente se procedió a entregar la información procesada tanto a la Universidad a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría y al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS)

Los resultados de esta investigación arrojó la siguiente información, el 97% de los créditos evaluados son han ejecutados por mujeres y apenas un 3% por hombres, obteniendo además que el 57% de los créditos se encuentran cumpliendo las metas, superando al valor entregado por concepto de bono de Desarrollo Humano con resultados excelentes y buenos, sin embargo si consideramos aquellos emprendimientos de tercer nivel sumaría un 75% con ingresos mensuales entre 180\$ y 68\$.

Los proyectos donde mejores resultados de ingresos han tenido son las ciudades de Baños, Señora del Rosario, Ambato sin descuidar la ciudad de Pillarito, 95% de emprendimientos tienen resultados excelentes de un total de 261 créditos evaluados con unos ingresos promedios de 180 dólares de ingresos al mes.

Dentro del promedio de ingresos por sector observamos que los mejores han sido Baños, Mocha, Ambatillo, Pelileo, Huachi Totoras que superan los 200\$ de ingresos al mes.

Por la información arroja el estudio el CDH está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado.



Dr. Jaime Díaz

DOCENTE COORDINAR DEL PROYECTO
