

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE: "CIENCIAS ADMINISTRATIVAS"



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: "Organización de Empresas"



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: "PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO:

"Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos y microempresarios de la parroquia Huambaló (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua"

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Patricio Medina

DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:

Ing. Patricio Medina

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): El Centro Artesanal Huambaló (CENARHU)

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Sr. Mario Cisneros Presidente del Centro Artesanal Huambaló (CENARHU)

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCAD-OE- 51-SEP2013-FEB2014"

Ambato, Septiembre 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE: "CIENCIAS ADMINISTRATIVAS"



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: "Organización de Empresas"



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

NOMBRE DEL PROYECTO

"Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos y microempresarios de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua"

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: Ing. Patricio Medina

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): El centro artesanal Huambalo (CENARHU)

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
Sr. Mario Cisneros Presidente del Centro Artesanal Huambalo (CENARHU)

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCAD-OE-51-" SEP2013-FEB2014"

Ambato, Septiembre 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
1. Datos Generales del Proyecto.	4
1.1 Nombre del Proyecto.	
1.2 Entidad Ejecutora.	
1.3 Cobertura y Localización.	
1.4 Monto.	
1.5 Plazo de Ejecución.	
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	
1.7 Número de Docentes Participantes.	
1.8 Número de Estudiantes Participantes	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
2. Diagnóstico y Problema	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	
2.3 Línea Base del Proyecto.	
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	
3. Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	
3.2 Objetivos Específicos	
3.3 Matriz de Marco Lógico.	
4. Estrategia de Ejecución.	14
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	
5. Presupuesto y Financiamiento.	17
5.1 Presupuesto del Proyecto	
6. Anexos.	18
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1) DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua

1.2 ENTIDAD EJECUTORA.

Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Organización de Empresas.

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN.

Parroquia Huambalo del cantón Pelileo provincia de Tungurahua

1.4 MONTO.

2652,00 dólares

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN.

Ciclo Académico: Septiembre 2013 – Febrero 2014

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO.

Sector: Área Académica de la Carrera: Organización de Empresas

Tipo de Proyecto: Capacitación y Asesoría

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES.

1 (Uno)

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

5 (Cinco)

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S).

El Centro Artesanal Huambalo (CENARHU)

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS.

30

2) DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Huambaló es la principal parroquia de Pelileo. Está ubicada a siete kilómetros de la cabecera cantonal, en sentido sur oriental, hasta donde se puede llegar en diez minutos por una carretera asfaltada de primer orden. Conocida como la 'Capital del mueble', por la creciente actividad artesanal que se levanta en el lugar, en donde alrededor de 80 almacenes ofrecen al visitante una gran variedad en juegos de sala, comedor y dormitorio, elaborados a mano en las mejores maderas y con los más finos acabados, fruto de la creatividad de unas 1500 personas que diariamente trabajan en los más de 180 talleres y fábricas que aquí se encuentran.

No obstante, a más de motivar el motor productivo y comercial local en los últimos años, las artesanías que en Huambaló se construyen también surten a los almacenes y casas de muebles de las principales ciudades del país.

Los talleres están localizados en los ocho caseríos que conforman la parroquia, comprendida en aproximadamente 50 kilómetros cuadrados de superficie; a diferencia de lo que ocurre con los almacenes, que se concentran principalmente en El Centro y unos cuantos entre este y La Florida.

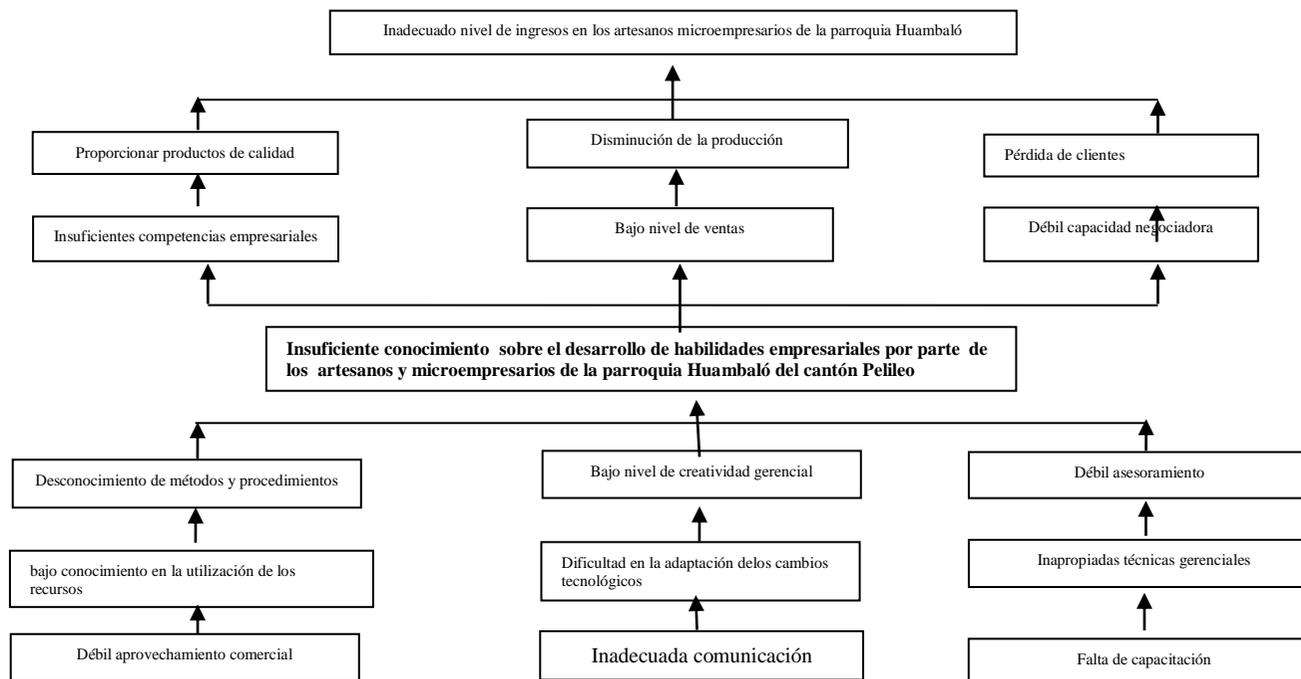
Son más de 25 años que el mueblista Huambaleño viene trabajando de manera organizada para haberse ganado un reconocimiento en el mercado nacional y la reputación de 'Capital del mueble', apoyados en las Expo ferias, va a cargo del Centro Artesanal Huambaló (CENARHU).

En todo caso, basta con darse un recorrido por los almacenes y talleres que existen en la parroquia para notar que acá se construyen los más finos muebles del Ecuador, en cuanto a calidad, durabilidad y precio, hechos a mano y empleando los mejores materiales.

Pero Huambaló no solo es muebles, pues aquí también existen granjas avícolas, agrícolas y ganaderas, gente que se dedica a la confección, al transporte y al comercio, ramos en los que se ocupan buena parte de la población, la misma que hoy por hoy supera los 15 mil habitantes, entre los que se cuenta un gran número de destacados profesionales, empresarios y ejecutivos.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



b). Interpretación:

Los artesanos de la parroquia Huambaló, poseen un desconocimiento en la utilización de métodos y procedimientos en la aplicación de habilidades gerenciales o al bajo conocimiento en la utilización de los recursos y al débil aprovechamiento comercial como una oportunidad de negocios en respectiva parroquia.

El bajo nivel de creatividad en el área gerencial se debe a la dificultad en la adaptación de los cambios tecnológicos, y por ende a la inadecuada comunicación.

De la misma manera el débil asesoramiento se da por las inadecuadas técnicas gerenciales en el campo empresarial debido a su falta de capacitación y por el poco interés de mejorar día a día.

Estas causas y subcausas redactadas anteriormente nos permite tener un amplio panorama que las actividades artesanales y micro empresariales se desarrollan de una manera empírica sin un criterio administrativo y gerencial, con lo cual es necesario e indispensable dar una capacitación y asesoramiento técnico para desarrollar las habilidades empresariales de quienes desarrollan actividades de índole empresarial.

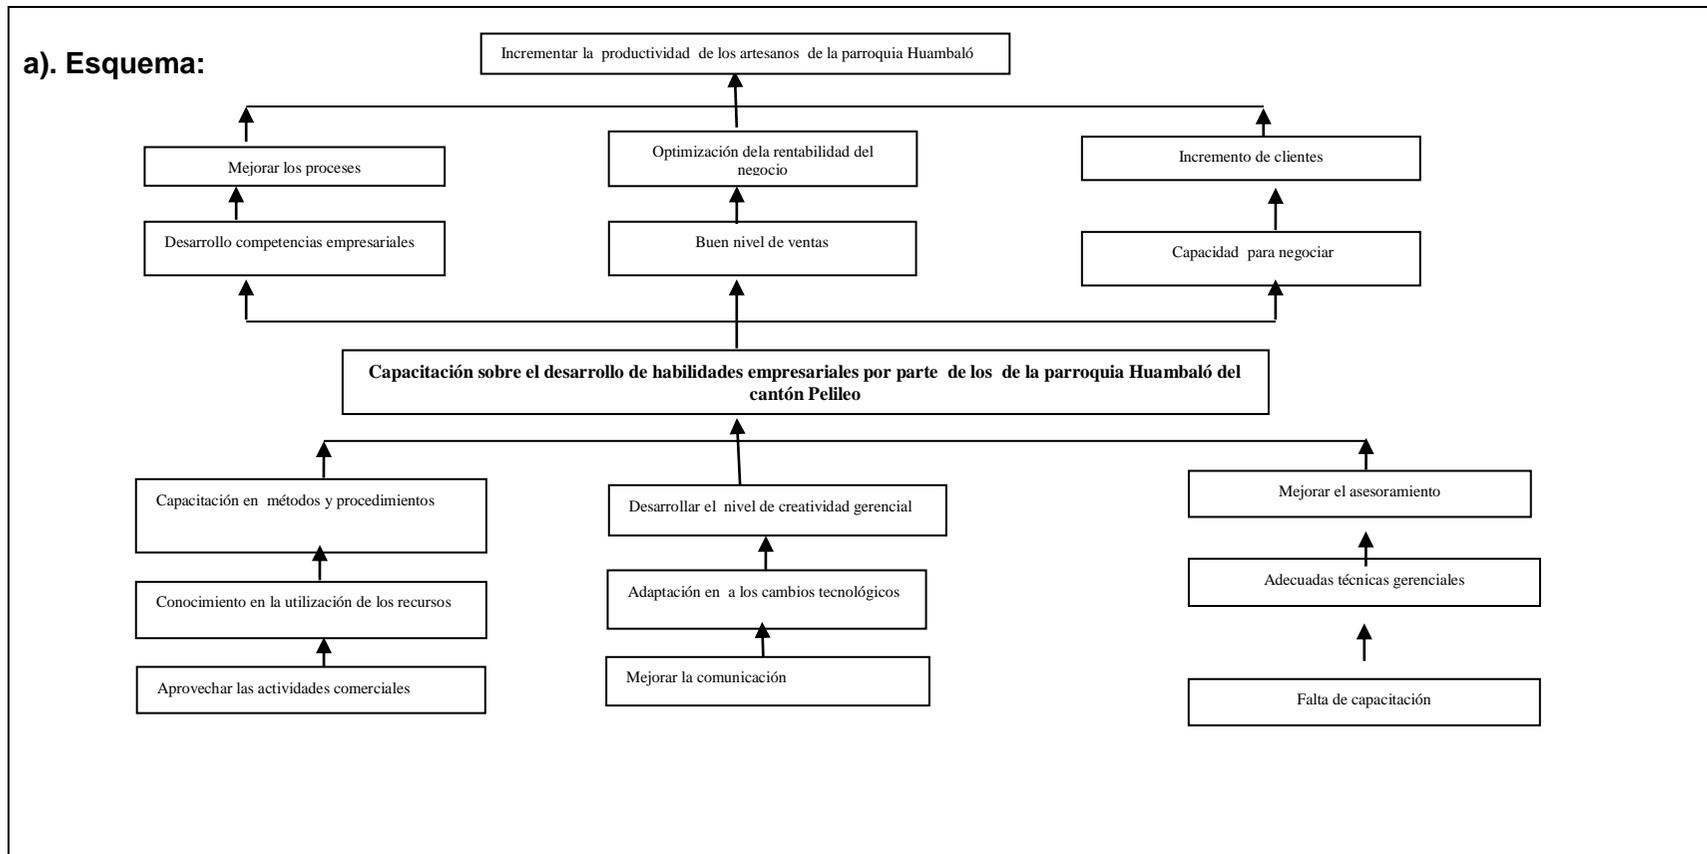
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

<p>SECTOR: Área Académica de la Carrera: Organización de Empresas</p>	<p>TIPO DE PROYECTO: Capacitación y asesoría</p>	<p>INDICADORES: 30 artesanos requieren una adecuada capacitación en desarrollo de habilidades empresariales para el desarrollo del proyecto.</p>
--	---	---

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Los beneficiarios serán 30 artesanos de la parroquia de Huambalo. **(CENARHU)**

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

- Brindar capacitaciones para el desarrollo de las habilidades empresariales para los artesanos de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Brindar asesoramiento técnico para que los artesanos promocionen de mejor manera sus productos.
- Mejorar las relaciones de los asistentes para que estos puedan trabajar en equipo.
- Desarrollar el liderazgo de los artesanos para que guíen de mejor manera sus respectivas microempresas.

3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO			
Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
FIN: Incrementar la productividad de los artesanos de la parroquia Huambaló	Indicadores del fin: El 70% de los hogares de los pequeños artesanos han mejorado la productividad de sus negocios	Medios del fin: Visitas en la parroquia por el equipo de trabajo (docente y alumnos)	Supuestos del fin: 1. Los pequeños artesanos realizan inversiones necesarias para garantizar su producción
PROPÓSITO: Capacitación sobre el desarrollo de habilidades empresariales por parte de los de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo	Indicadores del Propósito: Al menos un 80% de la producción se comercializa en la ciudad de Pelileo, al finalizar el proyecto.	Medios del propósito: Registros de ventas.	Supuestos del propósito: 2. El coste de los recursos necesarios para la producción (materiales, maderas, maquinaria, etc.) tienen un incremento significativo

Resumen de Objetivos	Narrativo de	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
COMPONENTES:		Indicadores de Componentes:	Medios de Componentes:	Supuestos de Componentes:
Capacitación en métodos y procedimientos			Estudio efectuado sobre mejora de procesos en el área artesanal	Poca información por parte de los artesanos
Conocimiento en la utilización de los recursos			Informe y Seguimiento del Proyecto.	Falta de seguimiento al proyecto
Aprovechar las actividades comerciales			Capacitación directa efectuada por la Unidad del Proyecto.	Incumplimiento en talleres y conferencias por parte de los integrantes del proyecto.
COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:		Presupuesto:	Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
		Fecha de inicio: Octubre 3 del 2013 a Enero 15 del 2014	Facultad de Ciencias Administrativas	Permisos de las autoridades para realizar la ejecución del proyecto, incluyendo a docente y estudiantes.
Componente 1.- Promoción de las actividades artesanales		Fecha de inicio: 17 Octubre 2013	Carta y acta de compromiso	
1.1 Utilización de recursos potenciales		Fecha de finalización: 10 de Noviembre 2013	Asistencia de estudiantes	
1.2 Aprovechamiento de la actividad comercial		Valor: 2652 usd	Boletines	
1.3 Oportunidades de negocio		Fecha de inicio: 17 Octubre 2013	Registro de asistencia de los participantes.	Predisposición de los estudiantes para que el proyecto se ejecute en los tiempos y plazos establecidos.
Componente 2.- Mejorar el nivel de competencias		Fecha de finalización: 10 de Noviembre 2013	Informe de los avances al coordinador	
2.1 Atención técnica				
2.2 Acceso a fuentes de				

<p>información 2.3 Utilización de medios de información</p> <p>Componente 3.- Brindar un Asesoramiento Técnico afines</p> <p>3.1 Experiencia de los pobladores de la parroquia</p> <p>3.2 Preparación</p> <p>3.3 Alto interés de los pobladores</p>	<p>Valor: 2652usd</p> <p>Fecha de inicio: 17 Octubre 2013</p> <p>Fecha de finalización: 10 de Noviembre 2013</p> <p>Valor: 2652 usd</p>	<p>Registro de asistencia</p> <p>Material de trabajo</p> <p>Informe al coordinados de las actividades cumplidas</p>	<p>Predisposición del presidente de las juntas parroquiales y autoridades de Emilio María Terán.</p> <p>Predisposición de autoridades de la parroquia, participantes y alumnos para la realización de los talleres y conferencias.</p>
---	---	---	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Identificación de métodos y procedimientos	03/10/2013	15/11/2013	91	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Actividad 1.1 conocimiento en la utilización de los recursos	03/10/2013	08/10/2013	10	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 1.1.1 Revisión bibliográfica	10/09/2013	25/10/2013	26	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Actividad 1.2 Aprovechamiento de la actividad comercial	28/10/2013	04/11/2013	13	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 1.2.1 Reunión con los dirigentes de CENTRO ARTESANAL HUAMBALÓ (CENARHU) y aceptación de compromisos entre las partes beneficiarias de compromisos entre las partes beneficiarias.	07/11/2013	11/11/2013	11	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 1.2.2 Reunión con equipo de apoyo y estudiantes para la participación.	14/11/2013	18/11/2013	12	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Actividad 1.3 Determinar oportunidades de negocio en las comunidades	20/11/2013	23/11/2013	10	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 1.3.1 Realizar un análisis situacional de las	27/11/2013	03/12/2013	11	Ing.	Equipos,

oportunidades y amenazas que ofrece el sector para aprovechar las fortalezas y eliminar debilidades en la actividades empresarial y artesanal	013	013		Patricio Medina	material, y pasajes
Componente 2: Mejorar el nivel de competencias de los artesanos	07/12/2013	19/12/2013	130	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Actividad 2.1 Brindar la atención técnica requerida	18/11/2013	25/11/2013	13	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 2.1.1 Elaborar cronograma de trabajos con los estudiantes	27/11/2013	03/11/2013	15	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Actividad 2.2. Acceso a fuentes de información	04/12/2013	11/12/2013	15	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 2.2.1 Elaborar material de trabajo en base a libros, Internet y otros	12/12/2013	19/12/2013	13	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Actividad 2.3 Utilización de medios de información	20/12/2013	27/12/2013	16	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 2.3.1 Imprimir los materiales y difundirlos a través de los representantes y participantes de la parroquia	28/12/2013	04/01/2014	14	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Componente 3: Brindar un Asesoramiento Técnico afines	05/01/2014	08/01/2014	42	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Actividad 3.1 Experiencia de los pobladores de la parroquia	09/01/2014	12/01/2014	13	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes

Subactividad 3.1 Realizar talleres participativos con artesanos y microempresarios que tenga experiencia técnica en el área empresarial junto con los estudiantes para fortalecimiento de sus capacidades personales	06/01/2014	10/01/2014	12	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 3.2 Preparación y ejecución de los talleres	12/01/2014	14/01/2014	9	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
Subactividad 3.3 Promover un Alto interés de los pobladores	15/01/2014	17/01/2014	8	Ing. Patricio Medina	Equipos, material, y pasajes
TOTAL			221		

 Ing. Fabián Chávez DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	 Sr. Mario Cisneros COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA	DOCENTES AUTORES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
		1. Ing. Patricio Medina	1. Srta. Lucia Castillo		
		2.	2. Srta. Fanny Chasiluiza		
		3.	3. Sr. Fernando Herrera		
		n.	4. Sr. Diego Hidalgo		
			5. Srta. Lidia Velasco		

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	N° DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO *COSTO HORA)
1	3	20	60	12.50	750.00
TOTAL DEL PROYECTO (USD)					750.00

F. 

Ing. Patricio Medina

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

6. ANEXOS

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
Anexo 2. El Acta de Aceptación; o,
Anexo 3. Convenio Suscrito.

Ambato, 7 de octubre del 2013

Centro Artesanal Huambaló

Sr. Mario Cisneros

ENTIDAD BENEFICIARIA

Presente


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de ciencias Administrativas Carrera de Organización de Empresas realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Ing. Luis Velásquez

DECANO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO
COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de **Octubre** del **dos mil trece**. La **Parroquia Huambalo del cantón Pelileo provincia de Tungurahua** representada por el **Sr. Mario Cisneros** en calidad de **Presidente del Centro Artesanal Huambalo (CENARHU)** la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el **Ing. Luis Velásquez** en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. La **Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo provincia de Tungurahua** es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de la Ley Orgánica: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, que en su Art. 5 manifiesta: .- “Autonomía .- La autonomía política y administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria”.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato **Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo provincia de Tungurahua**
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES


1.1 Parroquia Huambalo del cantón Pelileo provincia de Tungurahua se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Sr. Mario Cisneros los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.
- Aportar con los siguientes rubros a la ejecución del Proyecto: (especificar los aportes, de ser el caso, únicamente si existen acuerdos al respecto).

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Parroquia Huambalo del cantón Pelileo provincia de Tungurahua y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 14 días del mes de octubre del 2013

f. 

Ing. Luis Velásquez M.
DECANO FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS


f. 

Sr. Mario Cisneros
PRESIDENTE DEL CENTRO
ARTESANAL HUAMBALO
(CENARHU)

A. INFORME PLANIFICADO

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS**

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: "Capacitación para el desarrollo de las habilidades empresariales a los artesanos de la Parroquia Huambaló (CENARHU) del cantón Pelileo Provincia de Tungurahua CÓDIGO: "FCAD-OE-51-SEP2013-FEB2014"							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
1.Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Huambaló (CENARHU) del cantón Pelileo		DESDE 03 de Octubre del 2013	HASTA 17 de enero del 2014	# HORAS 221			
2.					TOTAL: 750 USD		
n.....							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30							
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. Sr. Mario Cisneros	1.Presidente del Centro artesanal Huambaló (CENARHU)	Ing. Patricio Medina	3	1 Herrera Fernando	80	1 Castillo Lucia	80
				2 Hidalgo Diego	80	2 Chasiluisa Fanny	80
				3		3 Velasco Lidia	80
				4		4	
				5		5	
				6		6	
				7		7	
				8		8	
				9		9	
				n.....			
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE		
f.  Ing. Patricio Medina DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  Ing. Fabián Chávez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			f.  Ing. Mg. Víctor Cascajosa DIRECTOR CENARHU		

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE: "Ciencias Administrativas"



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: "Organización de Empresas"



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"
NOMBRE DEL PROYECTO**

"Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos y microempresarios de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua"

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Patricio Medina
DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): Ing. Patricio Medina

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): El centro artesanal Huambalo (**CENARHU**)

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
Sr. Mario Cisneros Presidente del centro artesanal Huambalo (**CENARHU**)

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCAD-OE-51-SEP2013-FEB2014"

Ambato, Septiembre 2013


ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
1. Estrategias de Monitoreo.	28
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	32
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto	33

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:


COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD E TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	#HORAS		DESDE	HASTA	#HORAS	
Componente 1: Identificación de métodos y procedimientos	03/10/2013	15/11/2013	91	1116	03/10/2013	15/11/2013	91	1116
Actividad 1.1 Conocimiento en la utilización de los recursos.	03/10/2013	08/10/2013	10	120	03/10/2013	08/10/2013	10	120
Subactividad 1.1.1 Revisión bibliográfica	10/10/2013	25/10/2013	26	312	10/10/2013	25/10/2013	26	312
Actividad 1.2 Aprovechamiento de la actividad comercial	28/10/2013	04/11/2013	13	156	28/10/2013	04/11/2013	13	156
Subactividad 1.2.1 Reunión con los dirigentes de CENTRO ARTESANAL HUAMBALO (CENARHU) y aceptación de compromisos entre las partes beneficiarias.	07/11/2013	11/11/2013	11	132	07/11/2013	11/11/2013	11	132
Subactividad 1.2.2 Reunión con equipo de apoyo y estudiantes para la participación.	14/11/2013	18/11/2013	12	144	14/11/2013	18/11/2013	12	144
Actividad 1.3 Determinar oportunidades de negocio en las comunidades	20/11/2013	23/11/2013	10	120	20/11/2013	23/11/2013	10	120
Subactividad 1.3.1 Realizar un análisis situacional de las	27/11/2013	03/12/2013	11	132	27/11/2013	03/12/2013	11	132

oportunidades y amenazas que ofrece el sector para aprovechar las fortalezas y eliminar debilidades en la actividades empresarial y artesanal								
Componente 2: Mejorar el nivel de competencias de los artesanos	07/12/2013	19/12/2013	86	1032	07/12/2013	19/12/2013	86	1032
Actividad 2.1 Brindar la atención técnica requerida	18/11/2013	25/11/2013	13	156	18/11/2013	25/11/2013	13	156
Subactividad 2.1.1 Elaborar cronograma de trabajos con los estudiantes	27/11/2013	03/11/2013	15	180	27/11/2013	03/11/2013	15	180
Actividad 2.2. Acceso a fuentes de información	04/12/2013	11/12/2013	15	180	04/12/2013	11/12/2013	15	180
Subactividad 2.2.1 Elaborar material de trabajo en base a libros, Internet y otros	12/12/2013	19/12/2013	13	156	12/12/2013	19/12/2013	13	156
Actividad 2.3 Utilización de medios de información	20/12/2013	27/12/2013	16	192	20/12/2013	27/12/2013	16	192
Subactividad 2.3.1 Imprimir los materiales y difundirlos a través de los representantes y participantes de la parroquia	28/12/2013	04/01/2013	14	168	28/12/2013	04/01/2013	14	168
Componente 3: Brindar un Asesoramiento Técnico afines	05/01/2014	08/01/2014	42	504	05/01/2014	18/01/2014	35	420
Actividad 3.1 Experiencia de los pobladores de la parroquia	09/01/2014	12/01/2014	13	156	09/01/2014	12/01/2014	10	120
Subactividad 3.1.1 Realizar talleres participativos con	06/01/2014	10/01/2014	12	144	06/01/2014	10/01/2014	10	120

artesanos y microempresarios que tenga experiencia técnica en el área empresarial junto con los estudiantes para fortalecimiento de sus capacidades personales									
Subactividad 3.2 Preparación y ejecución de los talleres	12/01/2014	14/01/2014	9	108	12/01/2014	14/01/2014	8	96	
Subactividad 3.3 Promover un Alto interés de los pobladores	15/01/2014	17/01/2014	8	96	15/01/2014	17/01/2014	7	84	
Elaboración y presentación					13/01/2014	17/01/2014	7	84	
TOTAL			221	2652USD			219	2628USD	
F:  Ing. Patricio Medina DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	F:  Sr. Mario Cisneros COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			F:  Dr. Walter Jiménez COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS					



RESUMEN ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES

DATOS	HORAS CUMPLIDAS POR FECHA																			TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES							
	N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	Oct. 3	Oct. 8	Oct. 12	Oct. 17	Oct. 19	Oct. 24	Oct. 26	Oct. 29	Nov. 5	Nov. 9	Nov. 14	Nov. 16	Nov. 20	Nov. 23	Nov. 26	Nov. 30			Dic. 3	Dic. 7	Dic. 18	Dic. 21	Dic. 23	Dic. 28	Ene. 4
1	Castillo Lucia	1804977112	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	80	
2	Chasiluisa Fanny	1600460644	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	80	
3	Herrera Fernando	1802517670	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	80	
4	Hidalgo Diego	1600554172	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	80	
5	Velasco Lidia	1804690554	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	80	

F. 



Ing. Patricio Medina








DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO








F. 





Sr. Mario Cisneros
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: “Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos y microempresarios de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua” Docente Coordinador.- Ing. Patricio Medina					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
Jueves 03-10-2013	12:00	14:00	2	Elección y Fijación de recursos potenciales y adecuados para el inicio de la actividad	
Miércoles 09-10-2013	14:00	17:00	3	Elección y Fijación de recursos potenciales y adecuados para utilizar en la actividad, así como la elección de técnicas de enseñanza.	
Jueves 10-10-2013	12:00	14:00	2	Revisión bibliográfica para la preparación del material de apoyo	
Jueves 10-10-2013	15:00	17:00	2	Revisión bibliográfica para la preparación del material de apoyo	
Martes 15-10-2013	14:00	17:00	3	Analizar y adecuar la actividad comercial para la fijación de temas a utilizar en el proyecto de vinculación	






Miércoles 16-10-2013	14:00	17:00	3	Aprovechamiento de la actividad comercial para la fijación de temas a utilizar en el proyecto de vinculación	
Viernes 18-10-2013	13:00	17:00	4	Reunión con autoridades del Centro artesanal Huambalo (CENARHU) para coordinación y aceptación de compromisos entre las partes beneficiarias	
Martes 22-10-2013	12:00	13:00	1	Reunión con equipo de apoyo y estudiantes para planificar el desarrollo de las actividades planteadas, así como de los materiales a utilizar.	
Martes 22-10-2013	14:00	17:00	3	Reunión con equipo de apoyo y estudiantes para planificar el desarrollo de las actividades planteadas, así como de los materiales a utilizar.	
Jueves 24-10-2013	14:00	17:00	3	Reunión con equipo de apoyo y estudiantes para planificar el desarrollo de las actividades planteadas, así como de los materiales a utilizar.	
Martes 29-10-2013	13:00	17:00	4	Analizar y Determinar la capacidad de aprendizaje y aplicabilidad de los conocimientos en las actividades cotidianas de las personas del Centro artesanal Huambalo (CENARHU)	
Jueves 31-10-2013	12:00	13:00	1	Realizar un análisis situacional de las oportunidades y amenazas que ofrece el sector para aprovechar las fortalezas y así tener un enfoque más amplio para realizar la actividad y eliminar debilidades en la actividades empresarial y artesanal	
Jueves 31-10-2013	13:00	17:00	4	Realizar un análisis situacional de las oportunidades y amenazas que ofrece el sector para aprovechar las fortalezas y así tener un enfoque más amplio para realizar la actividad y eliminar debilidades en la actividades empresarial y artesanal	
					
					




Viernes 01-11-2013	14:00	17:00	3	Contribuir con la mejora de competencias de los artesanos para de esa manera estos lleguen a ser más innovadores con sus productos y contribuir más económicamente al sector	
Martes 05-11-2013	12:00	13:00	1	Ofrecer y brindar la atención técnica requerida a los artesanos para actuar como guías hacia el cumplimiento de sus actividades productivas	
Martes 05-11-2013	14:00	17:00	3	Ofrecer y brindar la atención técnica requerida a los artesanos para actuar como guías hacia el cumplimiento de sus actividades productivas	
Miércoles 06-11-2013	12:00	13:00	1	Realizar el cronograma de trabajos con los estudiantes para realizar de mejor manera la actividad de acuerdo al tiempo	
Miércoles 06-11-2013	14:00	17:00	3	Realizar el cronograma de trabajos con los estudiantes para realizar de mejor manera la actividad de acuerdo al tiempo	
Jueves 07-11-2013	12:00	13:00	1	Adquisición de información por parte de los estudiantes con el apoyo del presidente del Centro artesanal Huambalo (CENARHU)	
Jueves 07-11-2013	15:00	17:00	2	Adquisición de información por parte de los estudiantes con el apoyo del presidente del Centro artesanal Huambalo (CENARHU)	
Viernes 08-11-2013	12:00	13:00	1	Elaborar material de trabajo que se va a utilizar en base a libros, Internet y otros, y material proporcionado por la materia de Desarrollo de Habilidades Gerenciales	
Viernes 08-11-2013	14:00	17:00	3	Elaborar material de trabajo que se va a utilizar en base a libros, Internet y otros, y material proporcionado por la materia de Desarrollo de Habilidades Gerenciales	
Martes 12-11-2013	12:00	13:00	1	Enumerar los productos artesanales que presentan cada zona	

11-2013				productiva	
Martes 12-11-2013	14:00	17:00	3	Enumerar los productos artesanales que presentan cada zona productiva	
Miércoles 13-11-2013	14:00	17:00	3	Conocer los materiales que se utilizan para su elaboración.	
Jueves 14-11-2013	14:00	17:00	3	Analizar la posible integración de los productos realizados para darlos a conocer en los talleres.	
Viernes 15-11-2013	12:00	13:00	1	¿Cómo saber que la actividad a desarrollarse será beneficiaria en la parroquia?	
Martes 19-11-2013	15:00	17:00	2	Imprimir los materiales y difundirlos a través de los representantes y participantes de la parroquia, para que estos sepan lo que se está realizando	
Miércoles 20-11-2013	14:00	17:00	3	Reunión con el presidente del CENTRO ARTESANAL HUAMBALO	
Jueves 21-11-2013	12:00	13:00	1	Verificar los resultados obtenidos de: ¿Cómo saber que la actividad a desarrollarse será beneficiaria en la parroquia?	
Jueves 21-11-2013	15:00	17:00	2	Verificar los resultados obtenidos de: ¿Cómo saber que la actividad a desarrollarse será beneficiaria en la parroquia?	
Viernes 22-11-2013	14:00	17:00	3	Dar a conocer los resultados obtenidos a los estudiantes para su posterior análisis	
Martes 26-11-2013	12:00	13:00	1	Presentación de los documentos a utilizar al presidente del centro artesanal Huambalo para su respectiva aprobación.	

1. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
 “Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos y microempresarios de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua”

DÍA Y FECHA	HOR A INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
Martes 26-11-2013	15:00	17:00	2	Recogida del documento para la revisión por parte del presidente de la junta parroquial	
Jueves 28-11-2013	12:00	13:00	1	Acceso a fuentes de información en los interiores de la parroquia Emilio María Terán	
Viernes 29-11-2013	17:00	18:00	1	Reunir toda información recogida en un documento	
Martes 03-12-2013	14:00	16:00	2	Analizar la información obtenida para conocer los puntos débiles que posee la parroquia en productividad artesanal	
Miércoles 04-12-2013	14:00	17:00	3	Comparar los distintos puntos débiles que posee la parroquia en productividad artesanal	
Jueves 05-12-2013	16:00	17:00	1	Toma de decisiones para crear temas de interés para los habitantes que servirán para la exposición.	
Viernes 06-12-2013	12:00	13:00	1	Investigar cada uno de los temas de interés para la respectiva presentación	
Martes 10-12-2013	15:00	17:00	2	Selección de los temas que se expondrán en la exposición	

Miércoles 11-12-2013	10:00	12:00	2	Buscar información en libros, internet y otros, acerca de los distintos temas a verse	
Jueves 12- 12-2013	10:00	12:00	2	Realizar el documento teórico de cada uno de los temas para a trabajar	
Viernes 13- 12-2013	14:00	16:00	2	Imprimir el documento teórico de los temas que se verán	
Martes 17- 12-2013	15:00	17:00	2	Investigar acerca de los temas a tratarse	
Miércoles 18-12-2013	10:00	13:00	3	Buscar autores que sustenten nuestra investigación	
Jueves 19- 12-2013	15:00	17:00	2	Elaboración de la diapositivas que se expondrán ante los beneficiarios de la parroquia Huambaló	
Viernes 20- 12-2013	14:00	16:00	2	Elaborar material de trabajo que se va a utilizar para las exposiciones en las capacitaciones	
Viernes 03- 01-2014	12:00	13:00	1	Elaborar material de trabajo que se va a utilizar para las exposiciones en las capacitaciones	
Viernes 10-01-2013	14:00	16:00	2	Reunión entre los estudiantes para la planificación de los temas a exponer en el lugar correspondiente	

F: 
Ing. Patricio Medina
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 
Sr. Mario Cisneros
COORDINADOR (CENARHU)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Unidad de Vinculación con la Colectividad



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS“



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO:

“Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos y microempresarios de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahú”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Patricio Medina

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:

Ing. Patricio Medina

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): El centro artesanal Huambalo (**CENARHU**)

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Sr. Mario Cisneros Presidente del centro artesanal Huambalo (**CENARHU**)

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAD-OE- 51-SEP2013-FEB2014”

Ambato, Septiembre 2013

INDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
1. Informe Final	40
2. Evaluación de Resultados.	43
3. Fichas de Evaluación.	44
4. Resumen de Beneficiarios.	46
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	46
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	47
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	48
6. Producto (s) del Proyecto	50
7. Anexos	116

1. INFORME FINAL

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo en base a información de la situación actual busca desarrollar las habilidades empresariales de los artesanos de la parroquia de Huambaló del Cantón Pelileo, la principal actividad que se realiza la elaboración de muebles de madera y generación de microempresas en relación a esta actividad logrando desarrollar fuentes de desarrollo y trabajo para la parroquia y por ende para el cantón, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo de este trabajo es elaborar un plan para desarrollar las habilidades empresariales en los artesanos de la parroquia Huambaló del Cantón Pelileo provincia de Tungurahua que permita mejorar el desempeño empresarial en los artesanos y microempresarios de la parroquia. Para el desarrollo de este trabajo se contó con información de primera mano por los artesanos que integran el centro artesanal Huambalo (CENARHU) La fuente de este trabajo es la que se utilizó es la encuesta a los artesanos y además la observación directa las mismas que reflejaron que la mayoría de los artesanos de la parroquia Huambalo quienes opinan que la capacitación es una forma de desarrollar de mejor manera sus capacidades, logrando de este modo generar una gestión de dirección más adecuada para sus microempresas.

El siguiente plan de capacitación es integral porque se interactúa con los artesanos para identificar las falencias para con ello poder aumentar sus conocimientos, creatividad, desempeño e innovación lo que lograra maximizar los resultados y fortalecer la administración actual de estas microempresas para que se incremente la aceptación de los productos que ofrece el centro artesanal Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo. Finalmente, la presente trabajo sugiere que debe considerarse la ejecución del plan de capacitación que está de acuerdo a las necesidades de los artesanos con el objeto de desarrollar las habilidades empresariales.

ANTECEDENTES

La palabra Huambalo viene de la unión de tres voces que son GUA que significa grande UMBA que significa cuadro y ALO que significa eternamente, lo cual unidas las tres voces significa. "Cuadro eternamente grande".

Huambalo fue un caserío de Pelileo, pasando a constituirse en parroquia civil en el año de 1863 en la primera presidencia del Doctor Gabriel García Moreno, siendo sus caseríos Chaupi Yacu actualmente conocido actualmente como Segovia, Pachanqui hoy conocido como la florida, Surangay, el Poggio hoy la Merced, Huayrapata hoy conocido como San Francisco y el centro.

La parroquia de huambalo está situada a 9km de la ciudad de Pelileo al pie de las colinas de Mulmul, Quitasol, Tablón, Pusmasa y la Cruz considerados ramales del Iqualata.

Se encuentra a una altura de 2720 m.s.n.m. El clima que predomina es el clima templado en la parte baja y el templado en la parte alta.

La actividad artesanal referente a la elaboración del mueble se habría empezado hace unos 70 años de forma rústica, pero fue a partir de 1976 que cobra otro rumbo al punto de llegar a realizarse fabricación en serie.

El 18 de junio de 1996, con apenas 18 socios, se constituyó el CENARHU, como un centro de promoción directa del trabajo que realizan los artesanos. En la actualidad, los 30 socios exhiben sus mejores juegos de sala, comedor y dormitorio y del total de sus ventas dejan un 5% para atender asuntos administrativos de la Asociación.

Wilson Morales, de 46 años, fue el primer Presidente de esta organización, recuerda que el oficio lo aprendió en la Mueblería Aguirre y con el paso de los años se independizó, con otros compañeros.

La falta de organización, capacitación, comercialización entre otros son los principales problemas que tendrán que superar los pequeños y medianos artesanos de la parroquia para mejorar las condiciones de vida de las personas de este sector.

La importancia que un plan de capacitación nazca es fundamental para los artesanos y sobretodo con la participación de todos ellos, que son quienes conocen la realidad de la parroquia y saben lo que necesitan, permitirá asegurar que se realice la capacitación ya que el resultado de este trabajo va a tener éxito ya que es necesaria aplicarla en esta parroquia.

MAPA



ACTIVIDADES:

La gestión de la capacitación puede considerarse como el conjunto de procesos y actos que están relacionados con el diagnóstico, planificación, desarrollo y evaluación de actividades llevadas a cabo.

Antes de la realización de las capacitaciones se procedió a una pequeña conversación con los asistentes, para conocer qué tanta importancia le daban a la manera de liderar su centro artesanal, esta fue de mucha ayuda para proceder a realizar las capacitaciones planeadas.

Análisis de las necesidades de conocimiento: se realizó para conocer los aspectos cognitivos que deben ser incorporados en los trabajadores de las distintas empresas artesanales asociados al centro de artesanos (CENARHU), debido a problemas de desempeño manifiestos o cambios proyectados en el contenido y los requisitos de los puestos de trabajo, por innovaciones tecnológicas, cambios organizacionales y movimientos de personal

Planificación de la capacitación o la formación: relacionada con la capacidad de los Centros de Trabajo para identificar las necesidades de conocimiento, ser resueltas a través de la capacitación o la formación.

Además, es posible separar aquellas necesidades que pueden ser atendidas con recursos locales, regionales o centrales.

Desarrollo y control de las acciones de capacitación: para el desarrollo de esta actividad se realizó una intervención por parte del grupo de trabajo brindando un apoyo logístico de la capacitación, para desarrollar, supervisar y retroalimentar las actividades que se ejecutan en el Centro de artesanos (CENARHU).

Cabe recalcar que las actividades mencionadas se las realizo de manera individual para cada sección de capacitación realizadas. (2)

RESULTADOS E IMPACTO

En el presente proyecto se determina la importancia de la relación entre capacitación y Liderazgo en una empresa dentro del marco de la toma de decisiones, definiendo las mejores prácticas de detección de necesidades de capacitación y explicando el rol que juegan las actitudes de los trabajadores en la relación capacitación- Liderazgo. Se identificaron las causas que promueven la inversión en capacitación, verificando que los programas de capacitación cumplan con las necesidades de la organización.

En adición, se analizaron hasta qué grado influye la capacitación en la toma de decisiones de los artesanos determinando la relación existente entre capacitación y motivación. Finalmente, se identificaron los beneficios de dar capacitación a los propietarios y empleados, la disposición del trabajador ante la capacitación y la relación con la

satisfacción del trabajador.

Al realizar la Evaluación de resultados e impacto de la capacitación se pudo observar el desarrollo de las acciones realizadas en el ámbito de la capacitación. Además se realizó una comparación de los costos de las acciones realizadas respecto a los beneficios que se reportan para el centro artesanal. Con esto podemos deducir que las capacitaciones realizadas fueron de mucha ayuda para el centro de artesanos (CENARHU), ya que evidentemente se vio reflejada una mejora en la toma de decisiones, y esto nos llena de satisfacción puesto que nuestra colaboración tanto para el centro artesanal como para la parroquia ha sido de gran impacto.

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Incrementar la productividad de los artesanos de la parroquia Huambaló	El proyecto culminó el 17 de enero con la presentación del informe final a la Unidad de Vinculación de la Facultad de Ciencias Administrativas.	Documento impreso y magnético entregado a la Unidad de Vinculación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato	100%
PROPÓSITO: Capacitación sobre el desarrollo de habilidades empresariales por parte de los de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo	Durante el mes de enero del 2014, se procede a la realización de capacitaciones con el propósito de desarrollar habilidades empresariales en los beneficiarios de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo	Módulos y material de apoyo entregados a los beneficiarios de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo como aporte a la capacitación.	100%
COMPONENTE 1: Promoción de las actividades artesanales.	Al finalizar el mes de octubre del 2013, se realiza un levantamiento de información sobre las principales actividades que se realiza en la parroquia Huambaló del cantón Pelileo	Se obtiene insumos para su posterior estudio y análisis.	100%
COMPONENTE 2: Mejorar el nivel de competencias	Al finalizar el mes de noviembre se determinan las competencias de los beneficiarios de la parroquia, con el propósito de definir que habilidades pueden desarrollarse	Se logran definir las capacidades en función de las actividades que realizan	100%
COMPONENTE 3: Brindar un Asesoramiento	Durante los primeros días del mes de enero del 2014 se prepara los temas para dar asesoría y capacitación a los beneficiarios de	Conforme a la metodología y planificación se procede a ejecutar las capacitaciones en la junta parroquial, teniendo como resultados: Asistencia	100%

Técnico afines	la parroquia.	Evaluaciones Encuestas	
VALORACIÓN FINAL: Las actividades se cumplieron en función de lo planificado, logrando capacitar y asesorar a pequeños artesanos en mejorar sus habilidades en beneficio su parroquia y cantón			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se debería ejecutar este tipo de eventos en conjunto con la entidad (CENARHU) y organismos locales			
 F: _____ Ing. Patricio Medina DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 F: _____ Sr. Mario Cisneros COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	
		 F: _____ Dr. Walter Jiménez COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD	



3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: El centro artesanal Huambalo (CENARHU)

NOMBRE DEL PROYECTO: "Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua"

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Srta. Castillo Salan Lucia Eugenia	80	APRUEBA	1			
2	Srta. Chasiluisa Gavilema Fanny Elizabeth	80	APRUEBA	2			
3	Sr. Herrera Villalba Fernando Octavio	80	APRUEBA	3			
4	Sr. Hidalgo Silva Diego Marcelo	80	APRUEBA	4			
5	Srta. Velasco Supe Lidia Elizabeth	80	APRUEBA	5			

F: _____

Ing. Patricio Medina

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 14 de Enero del 2014

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: “Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	19
	MUJER	11
	SUBTOTAL	30
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	3
	DE 30 A 64 AÑOS	27
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	30
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS NACIONALIDADES Y	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	30
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	30
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	

F.  _____

Ing. Patricio Medina

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO
COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,
MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua"				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Pelileo	Huambalo	30
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				30

FUENTE: oficio DIFLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. 

Ing. Patricio Medina

Ing. Patricio Medina
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
CERTIFICADO

El Suscrito Señor. Mario Cisneros Presidente del Centro Artesanal Huambalo **(CENARHU)** del cantón Pelileo provincia de Tungurahua en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la **Sociedad “Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales a los artesanos de la parroquia Huambalo (CENARHU) del cantón Pelileo provincia de Tungurahua”** con una duración total de 229 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 30 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Pelileo, 13 Enero, 2014.


f.  _____

Sr. Mario Cisneros
Presidente del Centro Artesanal Huambalo (CENARHU)

C) INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS**

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: "Capacitación para el desarrollo de las habilidades empresariales a los artesanos de la Parroquia Huambaló (CENARHU) del cantón Pelileo Provincia de Tungurahua CÓDIGO: "FCAD-OE-46-SEP2013-FEB2014"								
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Huambaló (CENARHU) del cantón Pelileo		DESDE 03 de Octubre del 2013	HASTA 17 de enero del 2014	# HORAS 221	TOTAL: 750 USD			
2. _____ n.....								
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30								
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS	
1. Sr. Mario Cisneros	1. Presidente del Centro artesanal Huambaló (CENARHU)	Ing. Patricio Medina	3	1 Herrera Fernando	80	1 Castillo Lucia	80	
				2 Hidalgo Diego	80	2 Chasiluisa fanny	80	
				3			3 Velasco lidia	80
				4			4	
				5			5	
				6			6	
				7			7	
				8			8	
				9			9	
PRESENTADO POR: f.  Ing. Patricio Medina DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR: f.  Dr. Walter Jiménez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			INFORME FAVORABLE f.  Ing. Mg. Victor Guzmán DIRECTOR SEVIC-UTA			

